現場の箱庭 の使い方

更地から竣工まで、現場全体の工事の進み方を日付スライダーで3Dで見られます。

ramunekyuzin.github.io/gennba-/hakoniwa.html

1 はじめに

準備

1. 上のURLをスマホ・iPad・パソコンのブラウザで開きます。
2. 開いた日（今日）の時点の現場が出てきます。


ホーム画面に追加する

- **iPhone・iPad:Safari**で開いて、共有ボタン →**「ホーム画面に追加」**。
- **Android:Chrome**のメニュー →**「ホーム画面に追加」**。

> インターネットにつながっていないと表示されません（3Dの部品をネットから読みます）。

2 画面の見かた

基本

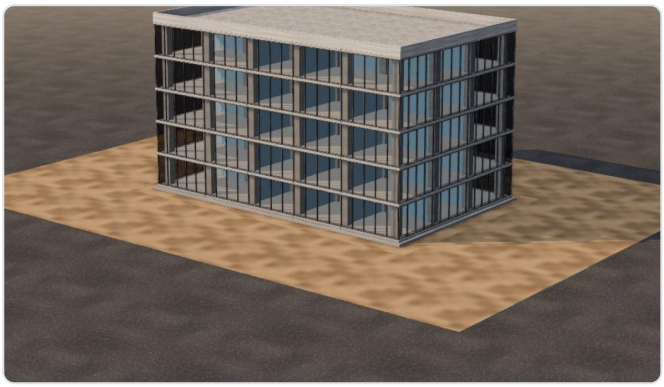

画面の例（10月30日）

場所	見えるもの・できること
左上	用途・階数・大きさ
設定	建物と工期を変える（→6・7）
高画質 ON	押すと OFF。動きが重いときに切ります
下の日付	スライダーで選んでいる日
オレンジの文字	その日に進んでいる工程（例：「いま：躯体 4・5階 / 外装 3階」）

建物の色の見かた

床（スラブ） 躯体（柱） 外装 内装（窓越しに見えます）

3 動かし方


操作

したいこと	スマホ・iPad	パソコン
まわす	1本指でなぞる	ドラッグ
拡大・縮小	2本指で広げる・つまむ	マウスのホイール
日付を変える	下のスライダーの●を左右に動かす	


- **いちばん左**は着工前の更地、**いちばん右**は竣工した状態です。
- 右へ動かすと、工程の順に現場が進みます（→4）。
- 部材は、その工程の進み具合（%）に合わせて少しずつ増えます。

4 工程の流れ


見どころ




杭工事（2月8日）



山留め・掘削（3月3日）




基礎工事（3月20日）



各階の工事（8月22日）



外構工事（11月5日）




竣工（12月5日）

工程	画面で見えること
① 更地	何もない土の敷地です。
② 準備工事	仮囲い（高さ3m）とゲートが少しずつ立ち、現場事務所と仮設トイレが置かれます。
③ 杭工事	青い杭打ち機が柱の位置を順に回り、杭を1本ずつ地面に打ち込みます。
④ 山留め・掘削	まわりに山留め（H鋼と横矢板）が入り、バックホウとダンプで地面が掘り下がります。
⑤ 基礎工事	捨てコン → フーチング → 基礎梁 → 基礎版の順にでき、最後に埋め戻します。
⑥ クレーン組立	タワークレーンが下から組み上がります。
⑦ 各階の工事	各階で 床 → 躯体 → 外装 → 内装 と進みます（→5）。
⑧ クレーン解体	外装が全部終わると、クレーンが上から外されます。
⑨ 外構工事	仮囲い・事務所を片付けて、舗装・植栽・駐車場の白線・植木ができて竣工です。

5 各階の工事の見え方

見どころ

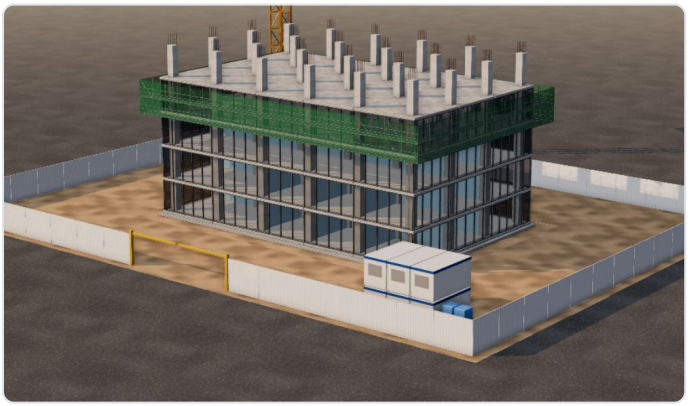

3階まで外装、4階は足場、5階は躯体（8月22日）

階の状態	見え方
躯体だけの階	柱と床だけ。柱の上から**鉄筋**が出ています（上の階の床ができると隠れます）
外装工事中の階	まわりに**足場**（パイプ・手すり）と、緑の**養生シート**が付きます
外装が終わった階	足場が外れて、外壁や窓が見えます
内装工事中の階	中の床や間仕切りが、窓越しにうっすら見えます

6 建物の設定

設定

1. 右上の **設定** を押します。
2. **用途** を押して選びます。
3. **階数**（1〜10階）、**間口**（2〜8スパン）、**奥行**（2〜5スパン）を選びます。柱は6m間隔です。
4. 下の **この内容で建てる** を押すと、建て直されます。



設定画面

用途	外観	階高
事務所	ガラスのカーテンウォール	3.5m
共同住宅	正面にバルコニー・手すり、腰壁つきの窓	3.0m
店舗	1階正面は大きなガラスと庇、上の階は外壁と横長の窓	1階 4.5m 上 3.5m
倉庫	金属の外壁、上の方に細い窓、1階にシャッター	6.0m
データセンター	窓のない外壁と縦のルーバー、屋上に冷却設備	5.0m

7 工期の設定

設定


かんたん設定

1. **着工日**（準備工事を始める日）を入れます。
2. **現場全体の日数**（準備・杭・山留め掘削・基礎・クレーン組立／解体・外構）を入れます。
3. **各階の日数**（床・躯体・外装・内装）と、**上の階へのずれ（日）** を入れます。
4. **この日数で工程を作り直す** を押すと、全部の工程ができます。

> 工程は少しずつ重ねて進むように作ります（杭が8割ほど進んだら掘削を始める、など）。1階の床は基礎工事が終わった次の日から始まり、クレーン解体と外構は外装がいちばん遅く終わる日のあとに入ります。

細かい調整

1. 「工程の細かい調整」で、**現場全体** と **各階** の工程ごとに開始日〜終了日を直します。
2. **この内容で建てる** を押します。



工程の細かい調整

- スライダーの範囲は、工程に合わせて自動で変わります。
- 階数を増やすと、増えた階の工程はかんたん設定から自動で足されます。
- **閉じる** を押すと、変えた内容は使われません。
- **サンプルに戻す** で、最初の見本（事務所・5階建て）に戻ります。

> **この日数で工程を作り直す** を押すと、細かく直した日付も作り直されます。細かい調整は最後にしてください。

⚠ 困ったとき

- **動きがカクカクする・重い：** 右上の **高画質 ON** を押して OFF にしてください。重い端末では最初から自動で OFF になります。
- **画面が真っ白・何も出ない：** インターネットにつながっているか確認して、ページを読み込み直してください。
- **全体が見えない・クレーンの上が切れる：** 2本指でつまむ（パソコンはホイール）と、縮小して全体が見えます。
- **「終了日が開始日より前になっています」と出る：** その工程の日付を直してから、もう一度 **この内容で建てる** を押してください。
- **設定が消えた・ほかの人と違う：** 設定は**その端末のブラウザにだけ**保存されます。別の端末やプライベートブラウズでは、最初の見本が出ます。
- **開いたときの日付：** 開いた日（今日）の状態で表示されます。工期の範囲外なら、いちばん端の日になります。
